


## II-5 김치 특화단지 조성

추진부서 (사업주체)	농촌활력과 (고창군)	팀장	김부호	담당자	김기덕	추진율	전체대비	23년대비
							10%	100%

구 분		연도별 목표	세부 추진실적
2022	4분기	추진방향 수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관련 단체 등 의견수렴</li> <li>○ 고창군 김치산업 육성 방향 수립</li> </ul>
2023	1분기	사업계획수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진계획 수립</li> <li>○ 사업 공모신청</li> </ul>
	2분기		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 23년 절임배추 6차 특화품목 확정(20억)</li> </ul>
	3분기	사업 신청	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업확정에 세부사업별 사업추진</li> </ul>
	4분기	사업 확정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 절임가공시설(리모델링) 2개소 구축 등</li> </ul>
2024		실행계획 수립	
2025		사업 추진	
2026		사업 추진	

### I 위치도(조감도)

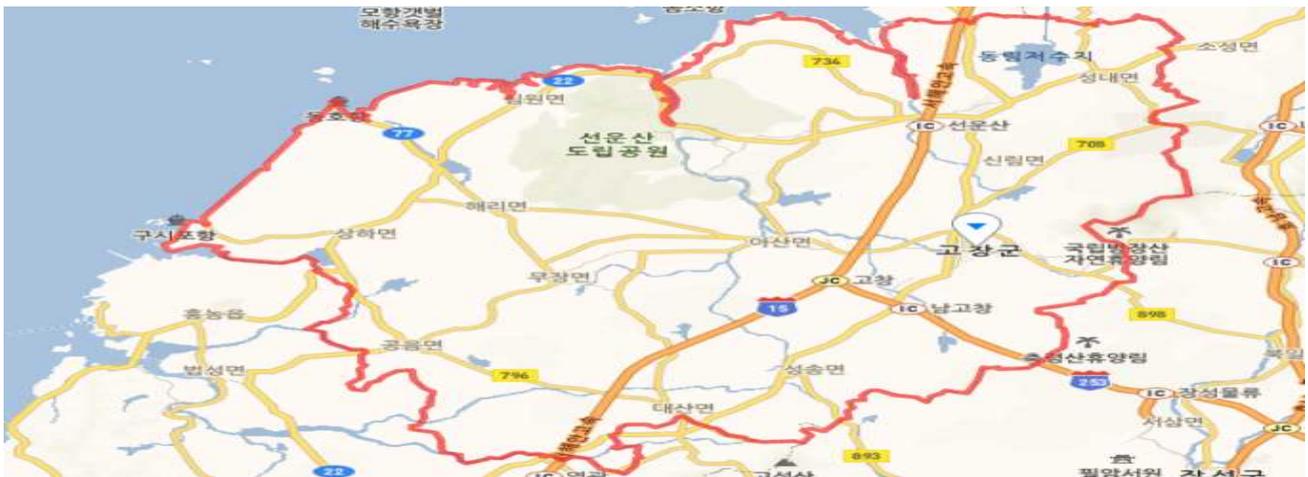

### II 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2027(6년)
- 총사업비 : 310억원(국비 116억원 도비 79.6 군비 112.3 자담 2.1)
  - 절임배추 6차 산업화사업 : 20억원(도비 10 군비 7.9 자담 2.1)
  - 김치원료 공급플랫폼구축 : 290억원(국비 116, 도비 69.6 군비 104.4)

○ 사업내용

- 소규모 김치(절임)공장 구축(리모델링 2개소, 신축 3개소)
- 대규모 절임가공시설 구축, 저온저장고(5,940m<sup>2</sup>) 등

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총액		31,000	11,600	7,960	11,230	210
2022			-	-	-	-
2023		400	-	200	140	60
2024		1800	400	640	660	100
2025		8300	3,080	2,148	3,022	50
2026		8900	3,480	2,188	3,232	-
임기후		11600	4,640	2,784	4,176	

III. 지금까지 추진상황

< 절임배추 6차특화품목 육성사업 >

- 추진방향 수립 및 추진주체 모집 ..... 2023. 1.~3월
- 23년 특화품목(김치/절임) 6차 산업화사업 공모 신청 ..... 2023.03.24.
- 특화품목 6차 산업화사업 공모선정 ..... 2023.04.04.  
- 사업비 : 20억원(도비 10 군비 7.9 자담 2.1) / 전라북도
- 김치절임산업 육성을 위한 세부계획 승인 ..... 2023.09월
- 23년 세부계획 승인에 따른 사업완료 ..... 2023.12월  
- SW : 연구개발, 홍보마케팅, 사업단 구축 / HW : 절임배추공장 리모델링 2개소
- 24년 특화품목 육성을 위한 세부계획 수립 ..... 2024.01~02월

< 사시사철 김치원료 공급플랫폼 구축 >

- 고창 김치원료 공급플랫폼사업 예산 요청 ..... 2023. 06~12.
- 24년 국가예산 반영(국비 4억원) ..... 2023. 12.

#### IV 향후 추진계획

##### < 절임배추 6차특화품목 육성사업 >

- 24년사업계획 승인에 따른 세부사업별 사업추진
  - 김치(절임) 시설구축 : 3개소( 24년 2<sup>(신축)</sup> 25년 1<sup>(신축)</sup>)
- 김치산업 중장기 발전계획 수립 및 연계사업 발굴 : 24년
- 김치(절임) 관련 업체 및 농가 역량강화 및 네트워크 구축 : 24년 ~ 26년
- 김치 양념개발 및 절임배추 표준공정 수립 등 : 24년 ~ 26년
- 김치산업 활성화를 위한 BI개발 및 홍보마케팅 등 : 24년 ~ 26년

##### < 사시사철 김치원료 공급플랫폼 구축 >

- 시행계획 수립 ..... 2024.02. ~05.
- 지방재정투자심사(중앙) ..... 2024. 05.
- 공유재산 관리계획 승인 ..... 2024. 05.
- 기본 및 실시설계 용역 ..... 2024. 07.~
- 사전행정절차(인허가 등) 추진 ..... 2024. 07.~
- 사업 착공 및 준공 ..... 2025.1 ~ 2027.12.
