


## Ⅲ-2 문수산권 관광지 조성

추진부서 (사업주체)	관광산업과 산림공원과 (고창군)	팀장	윤병준 (2951) 이황섭 (2620)	담당자	박종훈 (2954) 이여훈 (2597)	추진율	전체대비 80%	23년대비 100%
----------------	-------------------------	----	--------------------------------	-----	--------------------------------	-----	-------------	---------------

구	분	연도별 목표	세부 추진실적
2022	3분기	◦ 사업추진 및 시설 사용허가 협의	- 문수산 관광자원화사업 추진 - 문수산 편백숲 주차장 조성사업 추진
	4분기	◦ 사업추진 및 시설 사용허가 협의	- 문수산 관광자원화사업 추진 - 문수산 편백숲 주차장 조성사업 추진

구	분	연도별 목표	세부 추진실적
2023	1분기	◦ 사업추진 및 시설 사용허가 협의	- 문수산 관광자원화사업 추진 - 문수산 편백숲 주차장 조성사업 추진
	2분기	◦ 사업 추진	- 문수산 편백숲 공간재창조사업 준공 - 문수산 편백숲 주차장 조성사업 추진
	3~4분기	◦ 사업 추진	- 문수산 편백숲 주차장 조성사업 추진 - 문수산 관광자원화사업 추진 - 조산제 수변데크길 사용허가 협약(농어촌공사) - 국립고창치유의 숲 운영 - 문수산 조산제 관광자원개발사업 발주 및 착공

## I 위 치 도

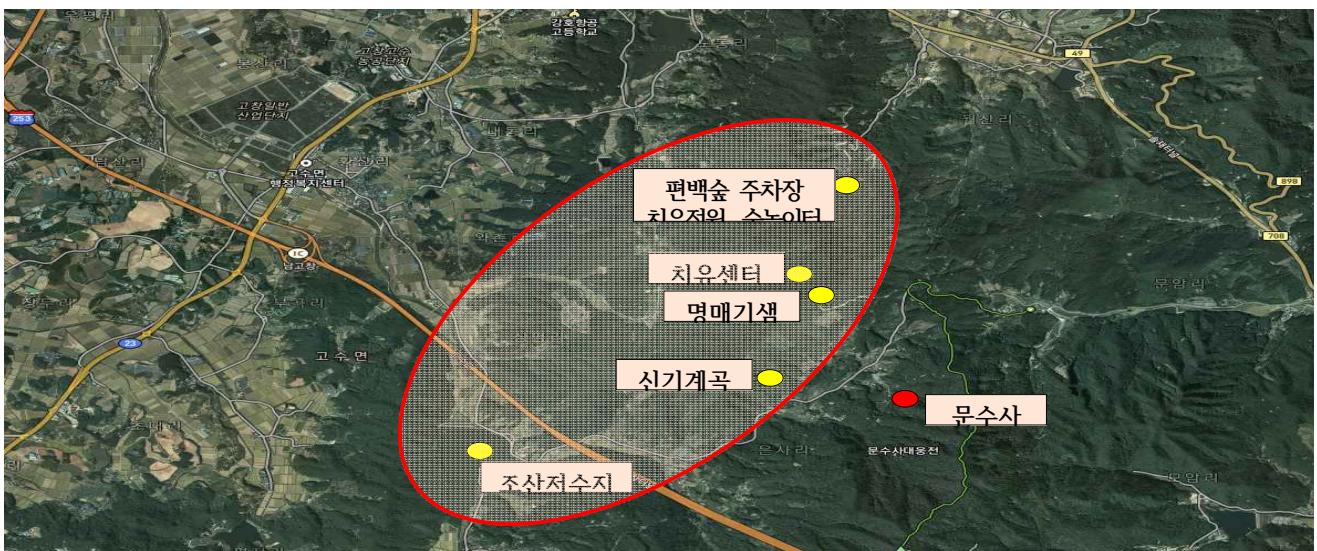

## Ⅱ 사업개요

- 사업명 : 문수산권 관광지 조성
- 사업기간 : 2022년~2024년(3개년)
- 사업비 : 244억원 (국비 120 도비 24 군비 100)
  - － 문수산편백숲공간재창조 : 190억 (산림청 120억 / 고창군70억)
  - － 문수산조산제 관광자원개발 : 54억 (고창군)
- 사업내용
  1. 편백숲공간재창조사업
    - ▶ 산림청 : 제1치유센터(고창읍), 제2치유센터(고수면), 치유정원, 숲속놀이터.문화마당, 숲탐방로 3.2km, 전망대 2개소
    - ▶ 고창군 : 주차장 53면, 별빛오름길(스카이워크등), 기반시설
  2. 문수산.조산제 관광자원개발
    - ▶ 1차분 : 신기계곡.마을관광기반정비, 명매기샘정비
    - ▶ 2차분 : 조산제 전망센터, 수상레저존, 수상데크 1.2km, 생태공원등

## Ⅲ 지금까지 추진상황

- 문수산 편백숲 공간재창조 준공 ..... 23. 6
  - － 국립 고창치유의 숲 명칭확정 (23. 6. 23 산림청)
- 편백숲 주차장 조성(공정률: 70%) ..... 23. 12.(현재)
- 문수산.조산제 관광자원개발사업(공정률: 50%) ..... 23. 12.(현재)
  - － 신기계곡.마을관광기반정비, 명매기샘 정비 등 1차분(30억) 완료
  - － 조산제 전망센터, 수상레저존, 수상데크, 생태공원등 2차분 설계중
  - ▶ 농어촌공사 고창지사 협의 완료(수상레저운영 부분 추후 협의)

#### Ⅳ 향후 추진계획

- 고창국립 치유의 숲 운영개시(계획) ..... 23. 12.
- 조산제 관광자원개발사업(2차분) 발주 ..... 23. 12.
- 문수산 편백숲 주차장 조성사업 완료 ..... 24. 3.
- 문수산권 관광지 사업완료 ..... 24. 12.
