

2023년도 결산기준 재정공시



특수공시 사업현황



2023 특수공시 대상사업 목록

2023회계연도 특수공시 대상사업

(단위 : 백만원)

연번	관련부서	사 업 명	사업비	비고
계		18건	101,362	
1	세계유산과	농촌관광 스타마을 조성사업	10,000	
2	세계유산과	고창군 예향천리마실길 관리	55	
3	문화예술과	고창황윤석도서관 건립	19,000	
4	문화예술과	고창문화원 다목적체험관 증축	900	
5	사회복지과	보훈회관 신축	4,300	
6	사회복지과	고창울계고령자복지주택 조성	17,600	
7	농업정책과	비가림 하우스 설치 지원사업	6,619	
8	농촌활력과	농식품바우처 시범사업	1,880	
9	해양수산물과	하전권역 어촌 유희시설 맞춤형 귀어스테이 조성사업	1,800	
10	해양수산물과	구시포항 오션뉴딜사업	7,000	
11	산림녹지과	월곡근린공원 도시숲 조성사업	1,000	
12	산림녹지과	도립공원 정비 및 생태계복원사업	720	
13	안전총괄과	장동 자연재해위험개선지구 정비사업	9,400	
14	안전총괄과	만화 자연재해위험개선지구 정비사업	9,800	
15	환경위생과	고창 영산기맥 솔재 생태축 복원사업	5,000	
16	환경위생과	운행경유차 배출가스 저감사업	2,820	
17	건 설 과	재해위험저수지 정비사업	3,400	
18	건 설 과	고창읍 교통사고 잦은곳 개선사업	68	

농촌관광 스타마을 조성사업

담당부서: 세계유산과 담당자: 손형도 연락처: 560-2952

- 복분자를 활용한 와인테마 관광명소 조성으로 지속가능한 관광모델 구축
- 주변 마을과 연계한 프로그램 운영으로 농촌관광 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 고창군 부안면 용산리 복분자 유원지 일원
- 총사업비 : 10,000백만원(도 4,000 군 4,000 민간 2,000)
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4년)
- 사업내용
 - 오감만족 와인 체험마루, 와인족욕체험센터 조성 1식 등
 - 와인빌리지 특화경관 조성, 브랜딩 및 마케팅 지원 등

□ 위치도



□ 추진상황

- 농촌관광 스타마을 조성사업 공모 선정 : 2023. 06.
- 지방재정 투자심사(도) 완료 : 2023. 11.
- 스타마을 사무국 설치 및 운영 : 2024. 01.
- 기본계획 및 실시설계용역 추진 : 2024. 04.~
- 와인족욕센터 예정지(구 황토찜질방) 철거 완료 : 2024. 05.

□ 금후계획

- 마을사업 발주 및 추진 : 2024. 08.~
- 기본계획 및 실시설계용역 완료(민자유치 포함) : 2024. 12.
- 농촌관광 스타마을 조성사업 추진 : 2025.~2026.

□ 기대효과

- 고창의 특산품(복분자)을 활용한 와인테마 관광명소 조성
- 주변 마을(진마, 용계, 용산, 안현마을 등)과 연계한 체험, 축제, 교육 등 프로그램 운영으로 전북특자도 대표 농촌 관광지 조성

고창군 예향천리마실길 관리

담당부서: 세계유산과 담당자: 유지연 연락처: 560-2687

- 고창군 관광자원과 연계하여 생태·문화·역사가 결합된 특색있는 마실길 조성으로 관광객의 걷기길 수요 충족 및 생태관광 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 고창군 예향천리마실길 일원
- 총사업량 : 1~10코스 115km
- 총사업비 : 55백만원(군비)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 안내판, 정자 등 시설물 보수, 예초 및 제초작업 등

□ 위치도



□ 추진상황 및 금후계획

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ○ 안내판 신규 설치 및 보수 | : 2023. 03. ~ 06. |
| ○ 예초 및 제초작업 | : 2023. 06. ~ 10. |
| ○ 잡목 제거 및 주변 환경 정비 | : 2023. 09. ~ 12. |
| ○ 안내판 및 시설물 설치 및 보수 | : 2024. 01. ~ 04. |
| ○ 예초 및 제초작업 | : 2024. 06. ~ 08. |
| ○ 예초 및 제초작업 | : 2024. 08. ~ 10. |
| ○ 시설물 보수 | : 2024. 10. ~ 11. |

□ 기대효과

- 예향천리마실길 시설물의 지속적인 관리를 통하여 걷기길을 이용하는 관광객 편의를 도모하고, 생태관광과 연계하여 지역경제 활성화 기여

고창황윤석도서관 건립

담당부서: 문화예술과, 담당자: 봉원용, 연락처: 560-2955

- 다양한 문화예술을 향유할 수 있는 복합문화 공간 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 고창읍 월곡리 873번지 일원
- 총사업량 : 지상2층, 지하1층 건물 신축
- 총사업비 : 19,000백만원(국비 5,900, 군비 13,100)
- 사업기간 : 2019 ~ 2025년
- 사업내용 : 생활SOC 복합화 사업(고창 황윤석도서관, 생활문화센터)

□ 위치도



□ 추진상황

- 문체부 도서관 건립 타당성 검토 : 2020. 04. ~ 05.
- 설계공모 시행 : 2020. 06.
- 지방재정투자 재심사 : 2021. 07. ~ 08.
- 통합설계용역 완료 : 2021. 12.
- 2차분 공사 착공 : 2023. 04.
- 목구조 공사 발주 및 계약 : 2023. 08.
- 지상 2층 철근콘크리트 골조 공사 : 2023. 12.
- 목구조 지붕틀 설치 : 2024. 06.

□ 금후계획

- 공사 준공 : 2025. 상반기

□ 기대효과

- 도서관과 생활문화센터의 복합 기능을 가진 문화공간 확충을 통한 지역 주민 소통 강화 및 문화도시 고창 실현

고창문화원 다목적체험관 증축

담당부서: 문화예술과, 담당자: 배혜민, 연락처: 560-2448

- 고창문화원 다목적체험관 증축을 통한 다양한 지역문화 체험 프로그램 운영으로 고창 향토문화 계승 및 지역문화 발전

□ 사업개요

- 위 치 : 고창읍 천변북로 119
- 총사업비 : 900백만원(특교 400, 특조, 300, 군비 200)
- 사업기간 : 2023 ~ 2024
- 사업내용 : 고창문화원 다목적 체험관 증축(2층→3층, 307.44m²)

□ 사진자료



□ 추진상황

- 기본 및 실시설계용역 추진 : 2023. 01.
- 건축물 경관심의 : 2023. 04.
- 공사 착공 : 2023. 08.
- 공사 준공 : 2024. 03. 30.
- 준공식 개최 : 2024. 04. 22.

□ 기대효과

- 고창 향토문화 계승 및 지역문화 발전 기능 강화

보훈회관 신축

담당부서: 사회복지과 담당자: 김은중 연락처: 560-2274

- 보훈가족의 복지증진 및 구심점 강화를 위한 통합공간 조성
- 국가를 위한 희생과 공헌에 합당한 예우로 보훈문화 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 고창읍 성산로 57
- 총사업비 : 4,300백만원(국비 500 도비 500 군비 3,300)
 - '23년 투자액 : 18백만원(군비)
 - '24년 본예산 : 2,111백만원(국250 도500 군1,361)
 - * 제1회 추경예산 확보(100백만원/군비)
 - '25년 계획액 : 2,171백만원(국250 군1,921)
- 사업기간 : 2023. ~ 2025.
- 사업내용 : 보훈회관 신축 1동(지상 3층, 연면적 998m²)
 - 단체 사무실, 다목적실, 소회의실, 휴게실, 갤러리 및 휴식공간, 하늘정원 등

□ 조감도



□ 추진상황

- 민선8기 공약사업 반영 : 2022. 07.
- 2023년 본예산 설계비 확보(100백만원) : 2022. 12.
- 건축 기획용역 시행 : 2023. 07.
- 국가예산 확보를 위한 중앙부처, 국회방문 : 2023. 07.~08.
 - 보건부, 기재부, 국회(윤준병, 이원택, 김성주, 김희곤 국회의원)
- 2024년 지방보훈회관 건립사업 확정(국가보훈부) : 2023. 09.
 - 국비 500백만원 확보(2024~2025년 지원)
- 도 예산 확보를 위한 도청 방문 및 도의원 면담 : 2023. 09.
- 보훈단체 의견수렴 및 선진지견학(곡성군, 순천시) : 2023. 10.
 - 침수대비 지반 기초보강 설계, 유품(훈장증 등) 전시공간 확보
- 건축 기획용역 준공 및 설계공모 심사위원회 구성 : 2023. 12.
- 일반설계 공모 시행 : 2024. 01.
- 일반설계 공모 심사위원회 개최 및 당선작 선정 : 2024. 02.
- 기본 및 실시설계용역 시행 및 착수보고회 개최 : 2024. 03.~04.
- 감리비 및 시설부대비 제1회 추경예산 확보(100백만원) : 2024. 06.
- 가족센터 해체(허가)계획서 작성용역 시행 : 2024. 07.

□ 금후계획

- 기본 및 실시설계용역 최종보고회 개최 : 2024. 08.
- 공사 발주 및 착공 : 2024. 09.
 - 현 가족센터 이전(8월 중)과 기존건물 철거 후 착공
- 보훈회관 신축 준공 및 개관식 : 2025. 10.

□ 기대효과

- 현 보훈회관의 공간협소에 따른 불편 해소 및 보훈가족의 복지 향상
- 지역주민에게 호국·보훈문화 확산을 위한 교육의 장으로 활용

고창읍계고령자복지주택 조성

담당부서: 사회복지과 담당자: 정동수 연락처: 560-2293

- 고령자 친화형 사회복지시설과 임대주택이 복합 설치된 고령자복지주택 건립으로 행복한 노후생활 지원

□ 사업개요

- 위 치 : 전북특별자치도 고창군 고창읍 읍계리 118
- 총사업비 : 17,600백만원(국 12,600 군 4,400 LH 600)
- 사업기간 : 2019 ~ 2024(6년)
- 사업내용 : 영구임대주택 128세대 및 사회복지시설 조성

□ 위치도



□ 추진상황

- 고령자복지주택 공모선정 : 2019. 04.
- 주택건설사업계획 승인(국토부고시 제2019-929호) : 2019. 12.
- 주택 건축설계용역 완료 : 2020. 12.
- 기반시설 공사준공(도로 및 배수로 정비) : 2021. 11.
- 고령자복지주택 공사 착공 : 2021. 11.
- 고령자복지주택 공사 준공 : 2023. 11.

□ 금후계획

- 사회복지시설 리모델링 완료 및 개관 : 2024. 08.
 - 체력단련실, 식당, 프로그램실, 강당 등

□ 기대효과

- 무주택 고령자를 대상으로 임대주택을 지원하여 안정적인 생활환경 제공
- 복지주택 내 사회복지시설을 조성하여 입주세대의 삶의 질 향상 도모

비가림 하우스 설치 지원사업

담당부서: 농업정책과 담당자: 최유종 연락처: 560-2532

- 기후변화와 FTA 시장 개방 확대 대응 방안으로 비가림 하우스 설치를 지원하여 시설원예 생산기반 확충 및 농업경쟁력 제고로 농가소득 증대

□ 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원
- 총사업량 : 5개사업(18ha)
- 총사업비 : 6,619백만원(국비 400, 도비 2,024, 군비 1,202, 자담 2,993)
- 사업기간 : 2023.1. ~ 12.
- 사업내용 : 고품질 원예작물 생산을 위한 비가림하우스 설치 지원

□ 추진상황

- 사업추진계획 통보 : 2023. 01.
- 사업 신청·접수 : 2023. 01.
- 사업대상자 확정·보조금 교부결정 : 2023. 02.~03.
- 사업추진 및 보조금 지급·정산 : 2023. 03.~12.
 - 소규모 비닐하우스 : 66농가/1.2ha/ 278백만원(보조 100, 자담 178)
 - 지역특화 비닐하우스 : 32농가/8.2ha/3,484백만원(보조 1,578, 자담 1,906)
 - 고추 비가림 하우스 : 30농가/7.2ha/2,002백만원(보조 944, 자담 1,058)
 - 청년희망 스마트팜 : 8농가/0.5ha/ 288백만원(보조 174, 자담 114)
 - 청년창업스마트팜패키지 : 2농가/0.6ha/1,219백만원(보조 704, 자담 515)

□ 기대효과

- 효과적인 환경제어를 통한 고품질 농산물 생산으로 농가 소득 증대

2023년 농식품바우처 시범사업

담당부서: 농촌활력과 담당자:김대수 연락처: 560-2737

- 취약계층의 식품 접근성 개선과 계층간 영양(건강) 불균형 완화를 위한 농산물 구매지원으로, 국민영양 안전망 구축 및 국산 농산물의 수요기반 확대

□ 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원
- 총사업량 : 4,480가구
- 총사업비 : 1,880,000천원(국비 940,000 군비 940,000)
- 사업기간 : 2023. 4 ~ 12. (9개월)
- 사업내용
 - 중위소득 50%이하 기초생활수급자 및 차상위 계층에 대한 식품비 차액지원
 - 꾸러미 배달서비스 운영 및 식생활교육 안내

□ 위치도



□ 추진상황

- 2023년 농식품바우처 공모신청(고창군→도) : 2022. 11. 29.
- 고창군 시범사업 대상 확정·통보(농식품부) : 2022. 12. 28.
- 농식품바우처 협의체 구성 및 운영 : 2023. 01. ~02.
- 성립전 예산 편성 및 읍·면 사업설명회 실시 : 2023. 02.
- 읍·면 홍보물 및 바우처카드 송부 : 2023. 02. 13.
- 농식품바우처 수혜자 신청접수 및 카드발급 : 2023. 2. 20.~
- 농식품바우처 사업시행 및 참여독려 : 2023. 04.~12.
- 사업완료 및 정산보고 : 2024. 01.

□ 기대효과

- 농식품바우처 지원을 통한 취약계층의 식품 접근성 강화 및 영양보충 지원
- 식품소비 촉진 증대를 통한 관내 농축산물의 지속 가능한 소비기반 구축

하전권역 어촌 유희시설 맞춤형 귀어스테이 조성사업

담당부서: 해양수산과 담당자: 최영찬 연락처: 560-2735

- 지방소멸 대응을 위한 하전권역 어촌 유희시설에 귀어·귀촌 희망자들의 안정적인 소득기반시설 조성으로 주민소득 증대 및 귀어·귀촌 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 심원면 하전권역(동전·서전·상전마을)일원
- 총사업량 : 어촌 유희시설 리모델링 9개소
- 총사업비 : 1,800백만원(도비 1,080 군비 720)
 - '23년 까지: 900백만원(도비 630 군비 270)
 - '24년 : 900백만원(도비 450 군비 450)
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.(3개년)
- 사업내용 : 유희시설 리모델링을 통해 어촌 살기 스테이션 조성, 어촌먹거리·경제 스테이션 조성 등 유희공간을 활용한 귀어 스테이 공간 구축

□ 위치도



□ 추진상황

- 실시설계용역 완료 : 2023. 05.
- 시설공사(건축·전기) 시행 및 착공('23년분) : 2023. 06.
 - 4개소(서전마을회관, 하전복지회관, 하전어민문화복지센터, 하전어촌휴양마을 2층)
- 시설공사(건축·전기) 준공('23년분) : 2023. 12.
- 시설공사(건축·전기) 시행 및 착공('24년분) : 2024. 02.
 - 5개소(상전마을회관, 상전경로당, 동전마을회관, 하전갯벌 정보화마을, 하전어촌체험마을)

□ 금후계획

- 시설공사(건축·전기) 준공('24년분) : 2024. 07.
- 노후 도장공사(하전어촌체험마을) 시행 및 착공 : 2024. 08.
- 사업총괄 준공 : 2024. 12.

□ 기대효과

- 귀어·귀촌 및 젊은 청년 창업자들이 정착할 수 있는 주거 공간과 창업공간 조성을 통한 인구유출 방지 및 일자리 창출

구시포항 오션뉴딜사업

담당부서: 해양수산과 담당자: 강현신 연락처: 560-2635

- 구시포항 및 배후지역의 신재생 에너지 보급 및 온실가스 배출 저감시설 등 탄소중립을 위한 기본 인프라 시설 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 상하면 구시포 국가어항 일원
- 총사업비 : 7,000백만원(국비 4,900, 도비 630, 군비 1,470)
 - '23년 까지 : 2,800백만원(국비 1,960, 도비 252, 군비 588)
 - '24년 : 2,100백만원(국비 1,470, 도비 189, 군비 441)
 - '24년 이후 : 2,100백만원(국비 1,470, 도비 189, 군비 441)
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.(4개년)
- 사업내용
 - 블루에너지 : 태양광 발전시설, 전기차 충전소 설치 등
 - 해양·체험지킴이 : 해양수질·파고 자동측정시스템, 해양감시시스템 등
 - 친환경 경관지킴이 : 구시포연안 배후지역 노후전력 설비 재생에너지 전환 등

□ 위치도



□ 추진상황

- 공기관 위수탁 협약체결 : 2022. 05.
- 기본계획 수립 : 2022. 12.
- 친환경 경관지킴이(경관조명, 쉼터 등) 준공 : 2023. 09.
- 블루에너지(태양광발전시설 등) 실시설계용역 완료 : 2024. 07.

□ 금후계획

- 블루에너지(태양광발전시설 등) 공사발주 및 착공 : 2024. 07.
- 해양체험 지킴이 실시설계용역 추진 : 2024. 07. ~ 09.
 - CCTV, 수질·파고측정시스템 등
- 기본계획 변경승인(에너지저장장치(ESS) 도입 등) : 2024. 07.
- 사업총괄 준공 : 2025. 12.

□ 기대효과

- 에너지 자립 구시포항 구축을 통한 주민 및 관광객들에게 탄소중립에 대한 인식 확산 및 친환경 탄소중립 거점지역 조성

월곡근린공원 도시숲 조성사업

담당부서: 산림녹지과 담당자: 정편성 연락처: 560-2606

- 공원 내 수목 생육상태가 불량하고 시설물 노후화로 인해 공원 리모델링 등 도시숲을 조성하여 주민들에게 휴식공간 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 고창읍 월곡리 587
- 총사업량 : 1.6ha
- 총사업비 : 1,000백만원(도 500, 군 500)
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 2024. 6.
- 사업내용
 - 토양치환 4,084m³, 맹암거 1,253m, 수목이식 180주, 수목식재 161주, 달조형물 1개소, 황토길 264m, 산책로 240m 등

□ 위치도



☐ 추진상황

- 실시설계 : 2023. 10. ~ 11.
- 사업 착공 : 2023. 12.
- 사업 준공 : 2024. 06.

☐ 금후계획

- 공원수목 및 시설물 유지관리 : 2024. 07. ~

☐ 기대효과

- 수목 생육환경 개선 및 편의시설 확충으로 도심 속 녹지공간을
제공하여 주민 건강증진 효과

도립공원 정비 및 생태계복원사업

담당부서: 산림녹지과 담당자: 손종국 연락처: 560-8684

- 도립공원 시설물 정비 및 쾌적한 환경 조성으로 탐방객 편의 증진 및 관광 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 선운산도립공원 일원
- 총사업량 : 생태체험단지 조성 1식, 정비사업 2식
- 총사업비 : 720백만원(도 360, 군 360)
- 사업기간 : 2023. 01. ~ 12.
- 사업내용
 - 동운암 녹차생태체험단지 조성 : 300백만원
 - 등산로 정비사업 : 270백만원
 - 탐방로 및 배수로 정비사업 : 150백만원

□ 위치도



□ 추진상황

- 실시설계 : 2023. 03.
- 문화재 현상변경 허가 등 행정절차 이행 : 2023. 03.
- 사업착공 : 2023. 04.
- 사업완료 : 2023. 09.

□ 기대효과

- 녹차생태체험단지 조성으로 관광객 유입 및 지역경제 활성화 도모
- 등산로 일제 정비 및 복원으로 탐방객 편의 증진
- 우기시 재해위험이 있는 배수로를 정비하여 안전사고 미리 예방

장동 자연재해위험개선지구 정비사업


담당부서: 안전총괄과 담당자: 이원석 연락처: 560-2663

- 재해위험요인을 사전에 정비하여 상습적인 침수지역 예방
- 자연친화적 하천 및 주변 정비로 지역주민 편익증대 기여

□ 사업개요

- 위치 : 공음면 구암리 957-6 일원(장동천)
- 총사업량 : 하천정비 L=1.038km(축제 2.042km, 교량 4개소, 배수통관 9개소)
- 총사업비 : 9,400백만원(국비 4,700, 도비 1,880, 군비 2,820)
* '23년 : 4,000백만원(국비 2,000, 도비 800, 군비 1,200)
- 사업기간 : 2021. 01. ~ 2025. 12.
- 사업내용 : 장동 자연재해위험개선지구(침수) 정비

□ 위치도

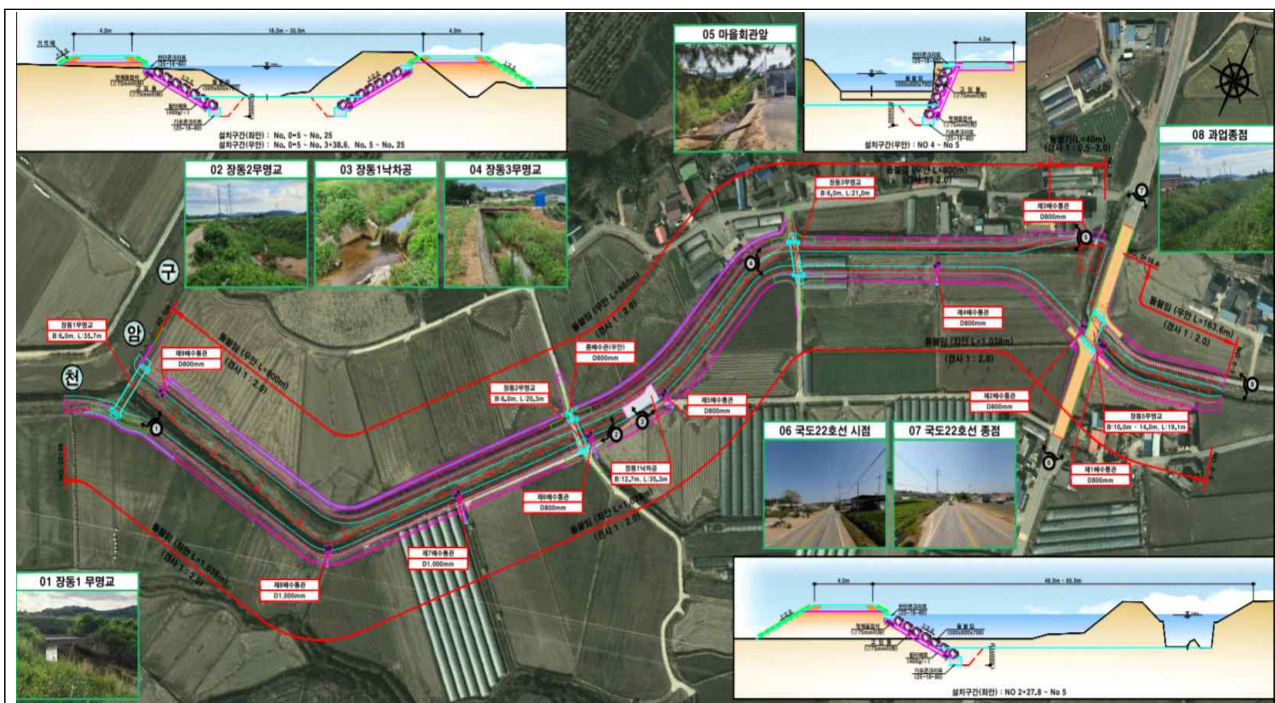

☐ 추진상황

- 21년 신규사업 확정 : 2020. 10.
- 기본 및 실시설계용역 착수 : 2021. 04.
- 문화재 지표 및 시굴조사 추진 : 2021. 09. ~ 2022. 07.
- 공사 착공 : 2022.12.

☐ 금후계획

- 공사 준공 : 2025.12.

☐ 기대효과

- 재해로부터 안전한 생활환경 조성으로 군민의 생명과 재산 보호

만화 자연재해위험개선지구 정비사업

담당부서: 안전총괄과 담당자: 이원석 연락처: 560-2663

- 재해위험요인을 사전에 정비하여 상습적인 침수지역 예방
- 자연친화적 하천 및 주변 정비로 지역주민 편익증대 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 무장면 신촌리 957-6 일원(구암천)
- 총사업량 : 하천정비 L=2.0km(축제 4.402km, 교량 7개소, 배수통관 22개소)
- 총사업비 : 9,800백만원(국 4,900 도 1,960 군 2,940)
- 사업기간 : 2019.01. ~ 2025.12.
- 사업내용 : 만화 자연재해위험개선지구(침수) 정비

□ 위치도



☐ 추진상황

- 19년 신규사업 확정 : 2018. 10.
- 실시설계용역 착수 : 2019. 03.
- 소규모환경영향평가 협의 완료(전북지방환경청) : 2022. 06.
- 공사 착공 : 2022. 12.

☐ 금후계획

- 공사 준공 : 2025. 12.

☐ 기대효과

- 재해로부터 안전한 생활환경 조성으로 군민의 생명과 재산 보호

고창 영산기맥 솔재 생태축 복원사업

담당부서: 환경위생과 담당자: 김인철 연락처: 560-2873

- 도로로 단절된 솔재 생태축을 연결함으로써 방장산, 문수산 일대 산림지역 생물다양성 확보 및 생물학적 수용 능력 강화

□ 사업개요

- 위 치 : 고창군 고창읍 월산리 산38-1번지 일원
- 총사업량 : 생태통로 조성 $A=2,100m^2$
- 총사업비 : 5,000백만원(국비 3,500 군비 1,500)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2023년 6월
- 사업내용 : 터널형 생태통로 $L=70m$, $B=30m$

□ 위치도



□ 추진상황

- 지방재정 투융자심사 완료 : 2020. 02.
- 기본 및 실시설계 착공 : 2020. 06.
- 행정절차 이행 및 완료 : 2021. 05.
 - 소규모환경영향평가, 산지전용, 군관리계획(도로) 변경, 비관리청 허가, 실시계획 인가 등
- 공사 착공 : 2021. 06.
- 공사 완료 : 2023. 06.

□ 금후계획

- 생태통로 유지관리 및 모니터링 : 2023. 06.~

□ 기대효과

- 도로로 단절된 영산기맥(솔재 일원)의 생물다양성 자원을 지속가능하게 보전·관리하여 생태계 근간을 마련하고 야생 동·식물의 서식환경 개선으로 생물권보전 전지역 고창의 청정한 이미지 제고

운행경유차 배출가스 저감사업

담당부서: 환경위생과 담당자: 김해림 연락처: 560-2876

- 노후경유차 및 건설기계의 전환 확대로 미세먼지 감축과 대기환경 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 관내일원
- 총사업량 : 1,268대
(조기폐차 1,098 저감장치 150 건설기계 엔진교체 10 LPG 화물차 10)
- 총사업비 : 2,820,251천원(국 1,426,625 도 418,088 군 975,538)
- 사업기간 : 2023년 2월 ~ 12월
- 사업내용 : 노후경유차(4등급·5등급) 및 건설기계(지게차, 굴착기) 제공해 조치 지원

□ 추진상황

- 운행경유차 배출가스 저감사업 공고 : 2023. 02. ~ 03.
- 지원대상자 선정 및 통보 : 2023. 03. ~ 04.
- 보조금 지급 : 2023. 04. ~ 12.
- '23년 지원 : 총 685대 1,793,685천원

□ 기대효과

- 운행 가능한 노후 경유차 조기폐차를 통해 미세먼지 등 대기오염 물질 발생의 근원적 감소

재해위험저수지 정비사업


담당부서: 건설과 담당자: 박경미 연락처: 560-2555

- 저수지 시설 노후로 인한 제방누수, 여방수로 파손, 여수토 방류 능력 부족 등으로 집중호우 시 저수지 붕괴 우려
- 재해위험 저수지 정비를 통한 인명 및 재산피해 예방 등 사전예방

□ 사업개요

- 위 치 : 아산면 중월리 중복제 등 3개소
- 총사업량 : 저수지 3개소(중복제, 중산제, 은동제) 정비
- 총사업비 : 3,400백만원(국비 1,700, 군비 1,700)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 사업내용 : 제체보강 및 그라우팅, 여·방수로 정비 등

□ 위치도

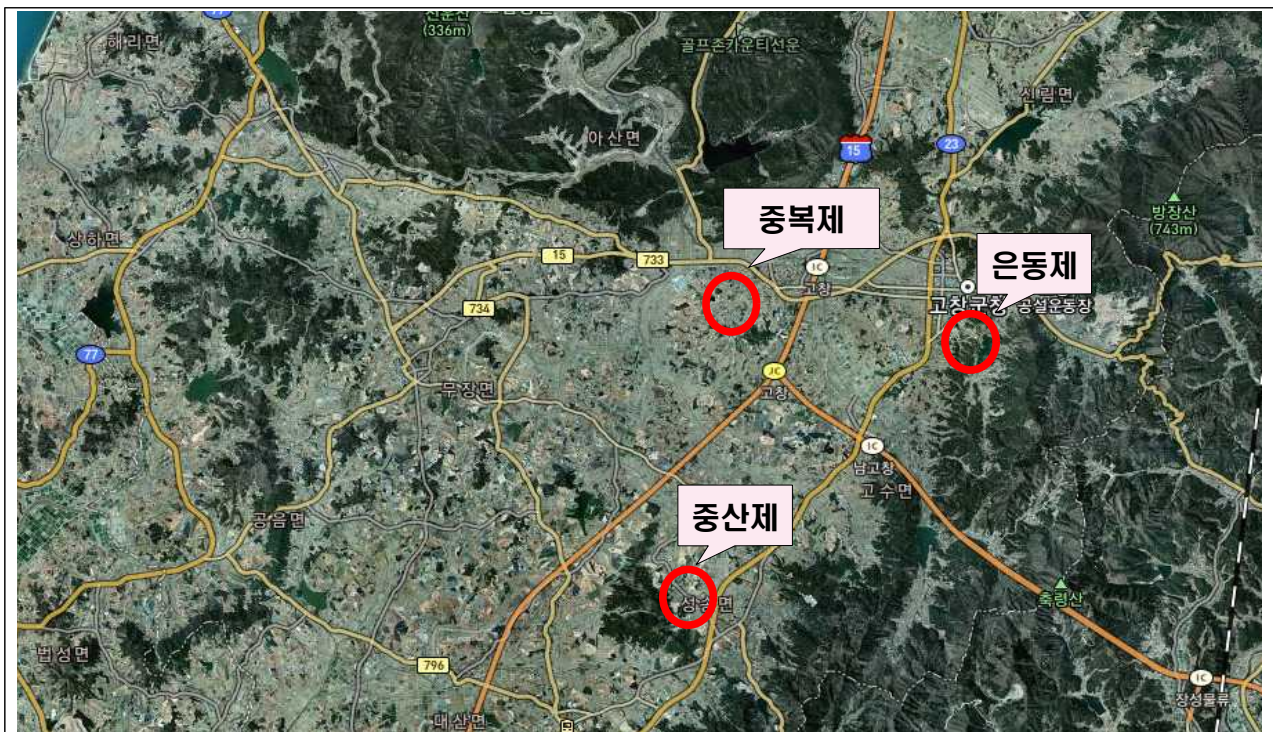

☐ 추진상황

- 실시설계용역 발주 및 착수 : 2023. 01.
- 실시설계용역 준공 : 2023. 06.
- 공사발주 및 착공 : 2023. 07.

☐ 금후계획

- 공사 총괄분 준공 : 2024. 12.

☐ 기대효과

- 재해위험저수지로 지정고시된 저수지에 대한 정비를 통하여 자연 재해로부터 군민의 생명과 재산을 보호

☐ 사업 시행 전후 사진



중산제 시행전



중산제 시행후

고창읍 교통사고 잦은곳 개선사업

담당부서:건설과 담당자:유철호 연락처: 560-2561

- 교통사고 다발지점에 대한 교통안전시설 설치 및 보강을 통한 사고 예방

□ 사업개요

- 위 치 : 고창군 고창읍 읍내리 216-5번지 일원
- 총사업량 : 안경세상앞 교차로 시설개선 1식
- 총사업비 : 68백만원(도비 34 군비 34)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사업내용 : 고온식 횡단보도 등 교통안전시설 설치

□ 위치도




☐ 추진상황

- 실시설계용역 완료 : 2023. 03. 17.
- 관계기관 협의 완료 : 2023. 03. 23.
- 공사착공 : 2023. 04. 12.
- 공사준공 : 2023. 06. 10.

☐ 기대효과

- 교통사고 다발지점 시설개선으로 교통사고 예방

☐ 사업 시행 전후 사진

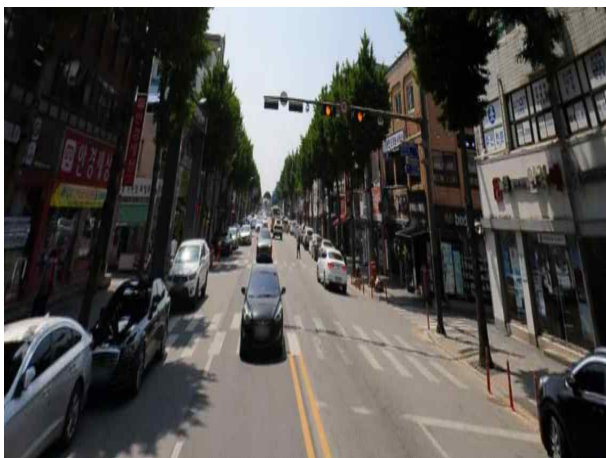

공사 시행 전



공사 시행 후
