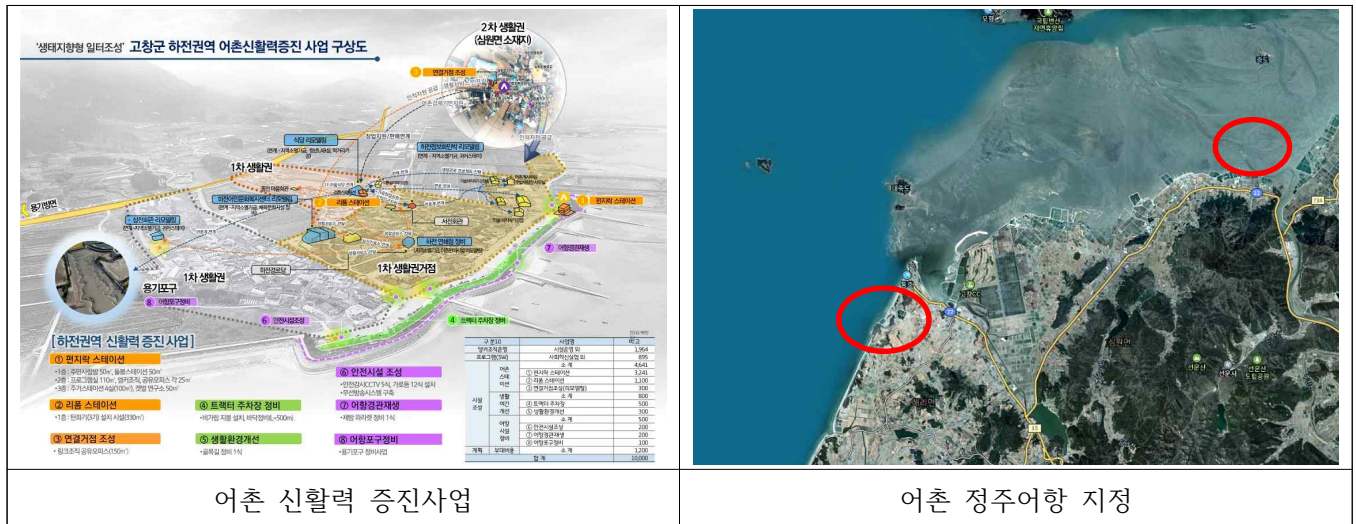


## I-15 어촌신활력 해양개발 및 광승·죽도 어촌정주어항 추진

추진부서 (사업주체)	해양수산과 (고창군)	팀장	강영호 (2625)	담당자	천성민 (2635)	추진율	전체대비 50%	23년대비 100%
----------------	----------------	----	---------------	-----	---------------	-----	-------------	---------------

구분	연도별 목표	세부 추진실적
2023	1분기	어촌뉴딜사업 추진 ◦어촌뉴딜사업 실시설계 및 시설공사 추진
	2분기	어촌뉴딜사업 추진 ◦어촌뉴딜사업 실시설계 및 시설공사 추진
	3분기	어촌뉴딜사업 추진 ◦어촌뉴딜사업 실시설계 및 시설공사 추진
	4분기	어촌뉴딜사업 준공 ◦어촌뉴딜사업 실시설계 및 시설공사 추진 ◦동호항·광승항 어촌뉴딜 300사업 준공
2024	22년 어촌뉴딜사업 준공	
2025	광승항 죽도항 어촌 정주어항 지정	

### I 위치도(조감도)



### II 사업개요

#### □ 어촌신활력 증진사업

- 위 치 : 고창군 심원면 하전권역(동전·서전·상전마을) 일원
- 사업기간 : 2024 ~ 2027(4개년)
- 총사업비 : 10,000백만원(국비 7,000, 도비 900 군비 2,100)
- 사업내용 : 편지락스테이션, 리폼스테이션, 연결거점 조성, 주차장 정비, 경관재생, 안전시설 조성, 포구정비사업, 어항경관 재생, 앵커조직 운영 등

## ○ 광승항, 죽도항 어촌정주어항 추진

- 위 치 : 해리면 광승리 광승항, 부안면 봉암리 내죽도 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026(5년)
- 사업내용 : 어촌정주어항 지정
- 지정권자 : 고창군(전라북도 협의 필요)

## ○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		12,100	7,000	900	2,700	1,500
2022		800	-	-	-	800
2023		300	-	-	300	-
2024		2,000	700	90	510	700
2025		2,000	1,400	180	420	-
2026		3,000	2,100	270	630	-
임기후		4,000	2,800	360	840	-

## III 지금까지 추진상황

\* 23년 12월말 기준으로 작성

- '24년 어촌신활력 증진사업 신규 공모사업 용역 추진 ... 2023. 6.~12.
- 광승항 선착장 조성공사 착공 .....2023. 09.
- 하전권역 어촌신활력 증진사업 공모 신청 .....2023. 10.
- 하전권역 어촌신활력 증진사업 현장평가 ..... 2023. 11.
- 동호항·광승항 어촌뉴딜 300사업 준공 ..... 2023. 12.

## IV 향후 추진계획

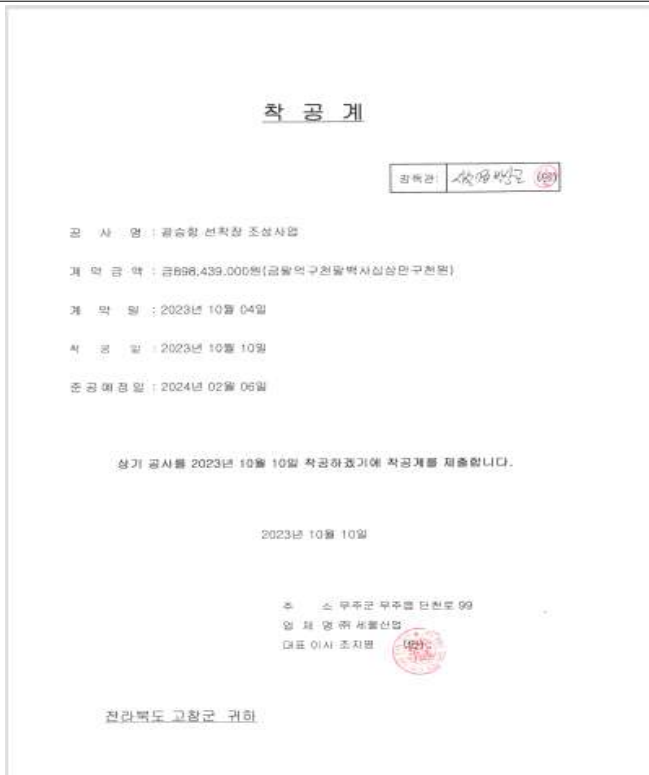
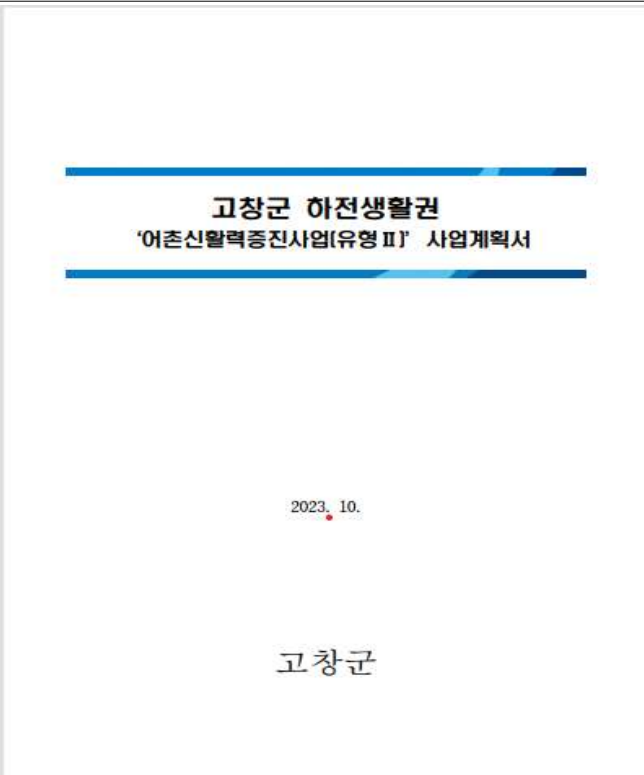
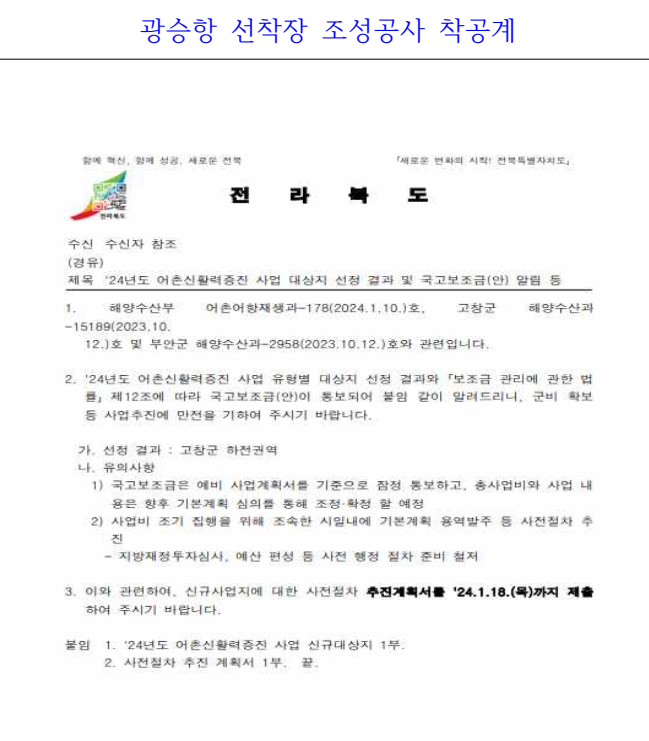

## [ 어촌신활력 증진사업 ]

- 하전권역 어촌신활력 증진사업 기본계획 및 실시설계용역 추진 .... 2024. 03.~11.
- 하전권역 어촌신활력 증진사업 기본계획 승인 및 고시 ..... 2024. 12.
- 하전권역 어촌신활력 증진사업 시설공사 발주 및 착공 ..... 2025. 01.
- 하전권역 어촌신활력 증진사업 사업 총괄준공 ..... 2027. 12.

## [ 광승항, 죽도항 어촌정주어항 추진 ]

- '광승항 진입도로 개설공사 실시설계용역 추진 .. 2024. 02.~04.
- '광승항 진입도로 개설공사 시설공사 발주 및 착공 ... 2024. 05.
- '광승항 진입도로 개설공사 사업 총괄준공 ..... 2024. 12.
- '광승항 선착장 조성공사 사업 총괄준공 ..... 2024. 12.
- 죽도항, 광승항 어촌정주어항 지정 ..... 2026. 12.

참고 추진실적 증빙자료 (관련 공문, 사진, 보도자료 등)

<p>광승항 선착장 조성공사 착공계</p>  <p>착 공 계</p> <p>광승항 선착장 조성사업</p> <p>계 약 금 액 : 금888,439,000원(금물역구천담박사십삼만구천원)</p> <p>계 약 일 : 2023년 10월 04일</p> <p>착 공 일 : 2023년 10월 10일</p> <p>준 공 예 정 일 : 2024년 02월 06일</p> <p>상기 공사를 2023년 10월 10일 착공하였기에 착공계를 제출합니다.</p> <p>2023년 10월 10일</p> <p>주 소 무주군 무주읍 단천로 99 광 승 항 생활산업 대표 이사 조지범</p> <p>전라북도 고창군 귀하</p>	<p>어촌 신활력 증진사업 예비계획서</p>  <p>고창군 하전생활권 '어촌신활력증진사업(유형 II)' 사업계획서</p> <p>2023. 10.</p> <p>고창군</p>
<p>광승항 선착장 조성공사 착공계</p>  <p>함께 혁신, 함께 성장, 새로운 전복</p> <p>전 라 북 도</p> <p>수신 수신자 참조 (경유)</p> <p>제목 '24년도 어촌신활력증진 사업 대상지 선정 결과 및 국고보조금(안) 알림 등</p> <p>1. 해양수산부 어촌어항재생과-178(2024.1.10.)호, 고창군 해양수산과-15189(2023.10.12.)호 및 무안군 해양수산과-2958(2023.10.12.)호와 관련입니다.</p> <p>2. '24년도 어촌신활력증진 사업 유형별 대상지 선정 결과와 「보조금 관리에 관한 법률」 제12조에 따라 국고보조금(안)이 통보되어 불임 같이 알려드리니, 군비 확보 등 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.</p> <p>가. 선정 결과 : 고창군 하전권역 나. 유의사항 1) 국고보조금은 예비 사업계획서를 기준으로 잠정 통보하고, 총사업비와 사업 내용은 향후 기본계획 심의를 통해 조정·확정 할 예정 2) 사업비 조기 집행을 위해 조속한 시일내에 기본계획 용역발주 등 사전절차 추진 - 지방재정투자심사, 예산 편성 등 사전 행정 절차 준비 철저</p> <p>3. 이와 관련하여, 신규사업지에 대한 사전절차 추진계획서를 '24.1.18.(목)까지 제출하여 주시기 바랍니다.</p> <p>불임 1. '24년도 어촌신활력증진 사업 신규대상지 1부. 2. 사전절차 추진 계획서 1부. 끝.</p>	<p>사회</p> <p>고창군 '어촌신활력 증진사업' 선정...100억원 확보</p> <p>이나라 기자 입력 2024.01.10 17:49</p> <p>댓글 0 1 추천 1 f t o s</p>  <p>전라북도 자료화면</p> <p>고창군이 해양수산부 주관 어촌신활력 증진사업에 선정돼 사업비 100억 원을 확보했습니다.</p> <p>이에 따라 고창군은 2027년까지 심원면 하전 권역의 돌봄과 주거, 교육 등 어촌 생활서비스를 개선하고 패류껍질 처리기와 마을회관, 트랙터 주차장 등을 정비합니다.</p> <p>어촌신활력 증진사업은 어촌 소멸위기에 대응해 선정 지역 300 곳에 총 3조 원을 투자해 어촌을 경제거점으로 육성하고 맞춤형 서비스 전달 체계를 구축하는 사업입니다.</p>
<p>어촌 신활력 증진사업 결과발표</p>	<p>어촌 신활력 증진사업 보도자료</p>
