


I-17 연안바다목장 조성

추진부서 (사업주체)	해양수산과 (고창군)	팀장	박종표 (2624)	담당자	이예지 (2646)	추진율	전체대비 20%	23년대비 100%
----------------	----------------	----	---------------	-----	---------------	-----	-------------	---------------

구 분		연도별 목표	세부 추진실적
2022	4분기	◦ 기본계획 수립	◦ 수산자원 산란·서식장 조성 기본계획 수립 - 산란·서식장 조성 공모사업의 정상 추진에 필요한 기술적 정보 및 기본계획 수립
2023	4분기	◦ 사업신청(해수부)	◦ 수산자원 산란·서식장 공모 신청완료
2024	1분기	◦ 적지조사 및 선정	
	2분기	◦ 산란·서식장 조성	
	3분기	◦ 종자 방류	
	4분기	◦ 효과조사 및 사후관리	
2025		◦ 사업 시행	
2026			
2027			

I 위치도(조감도)

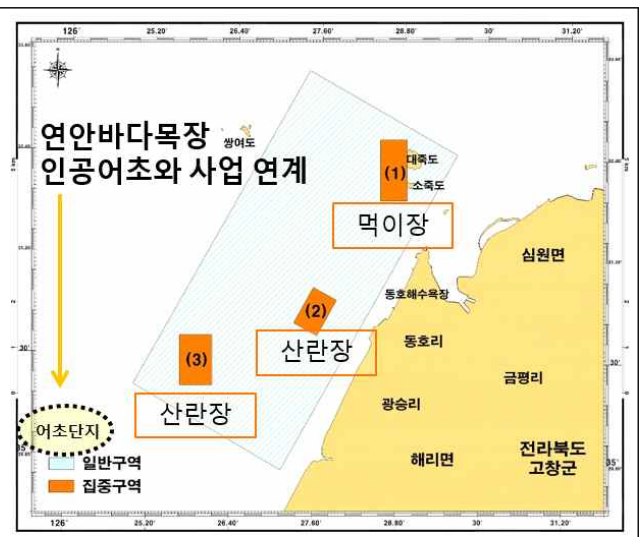

II 사업개요

- 위 치 : 고창군 연안일원(상하면 ~ 해리면)
- 사업기간 : 2025 ~ 2029(5개년)
- 총사업비 : 50억원(국비 25, 도비 5, 군비 20)
- 사업내용 : 조피볼락* 산란·서식장 조성하여 지속 가능한 수산자원 공급거점 구축
- * 당초 산란·서식장 조성 대상 품종이었던 주꾸미에서 조피볼락으로 변경 추진
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	3,000	1,500	300	1,200	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	1,000	500	100	400	-
2026	1,000	500	100	400	-
임기 후	3,000	1,500	300	1,200	-

III 지금까지 추진상황

- 기본계획 수립 및 추진 2022. 1. ~ 11.
 - 산란서식장 후보지 선정 기초조사 및 기반 조성 연구
- 2023년 산란서식장 조성사업 공모 신청(미선정) 2022. 12.
 - 20개소 신청 / 4개소 선정(남해군, 강릉시, 신안군, 서산시)
- 2024년 산란서식장 공모 대비 전문기관(수산자원공단) 협의 2023. 7. 27.
- 2024년 산란서식장 조성사업 공모 신청(미선정) 2023. 12.
 - 13개소 신청 / 6개소 선정(서귀포시, 거제시, 부안군, 포항시, 고흥군, 군산시)
- 2025년 산란서식장 공모 대비 및 연안바다목장* 사후관리를 위한 전문기관(수산자원관리공단) 협의 2024. 1.
- * 연안바다목장 사업 : 2018년 ~ 2022년 / 50억원 / 상하면 구시포 ~ 해리면 동호리 해역 일원

IV 향후 추진계획

- 2025년 산란서식장 조성사업 공모 신청·선정 2024. 12.
- 사업 추진 2025. ~
